

SAPA CONTROL

Приёмка квартиры

ЖК Sensata Plaza

Застройщик: Sensata Group

Год сдачи: 3 квартал 2023г.

Класс: Бизнес +






Неплотное прилегание дверного наличника.
Разная ширина зазоров.


Наличие дефекта на дверном полотне



Отсутствует изоляция швов нижнего и бокового оконного откоса.
Необходимо загерметизировать, во избежание попадания влаги в период осадков и ухудшения эксплуатационных и теплоизоляционных свойств фасадного утепления.

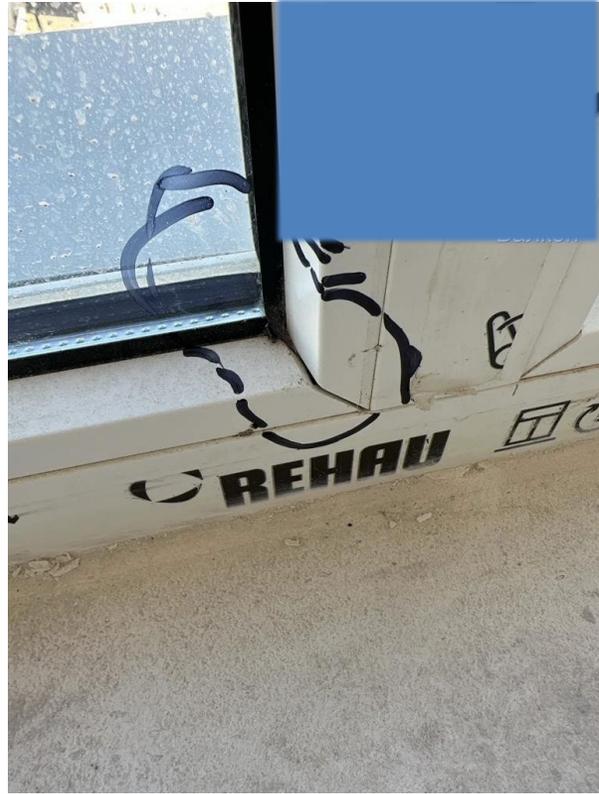

Наличие зазоров между штапиками

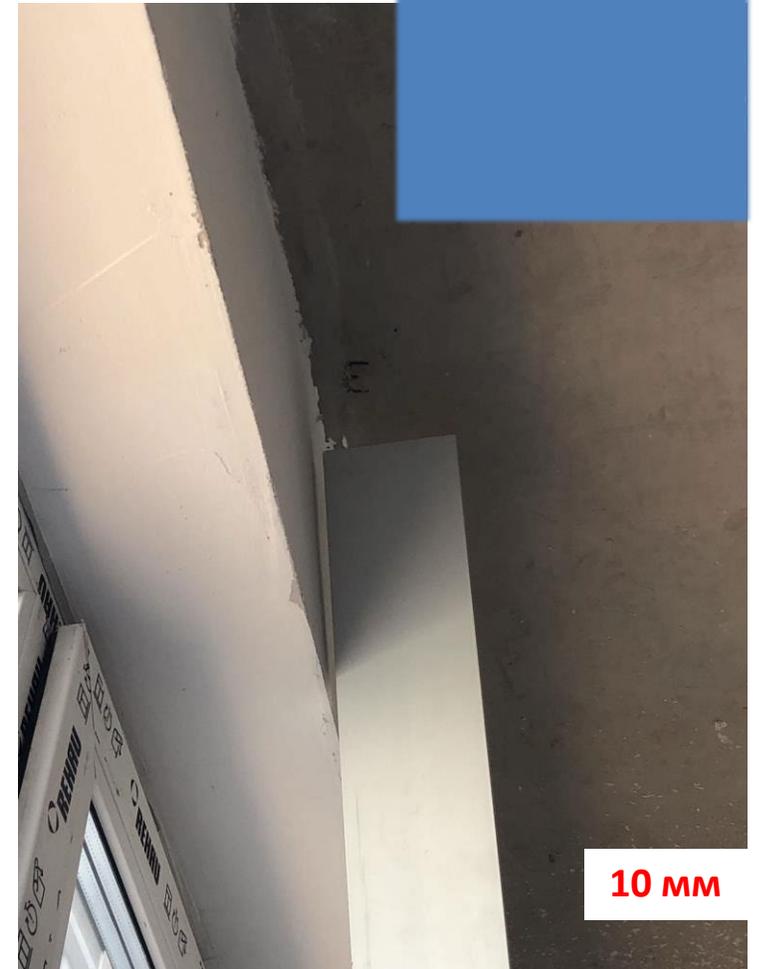

Отклонения по вертикали



Отклонения углов 90* от 7 до 20 мм



Перепады по стяжке до 14 мм.



1. Требуется заделка швов газоблочной кладки к плите перекрытия.
2. Наличие остатков смеси на канализационной трубе.



Не заделаны тех отверстия



Требуется повторно провести клининг по радиаторам



Наличие следов подтеков



Не подключена видео домофония
